



**CIRCOLARE D'INFORMAZIONE N.° 18 - SICUREZZA SUL LAVORO**

# **STATISTICA DELLE NON CONFORMITA' RILEVATE DAL C.P.T. DI PADOVA NEL 2005: ANCORA I PONTEGGI AL PRIMO POSTO!**

Il tema specifico è rivolto alle **NON CONFORMITA'** (nel senso d'infrazioni documentali e sostanziali) rilevate durante i sopralluoghi effettuati dal nostro personale tecnico nei cantieri della Provincia di Padova, per un totale di **266** visite effettuate nel corso dell'anno 2005.

L'obiettivo delle tabelle allegate, è quello di evidenziare una sintesi della tipologia delle situazioni anomale riscontrate durante le visite effettuate presso i cantieri di Padova e provincia.

Occorre precisare che con il termine **NON CONFORMITA'** ci si riferisce ad una situazione che non rispetta le disposizioni legislative vigenti e che quindi rappresenta un mancato adempimento perseguibile con sanzione. Spesso le anomalie riscontrate sono riconducibili ad infrazioni relative ad articoli del D.P.R. 164-56, del D.Lgs 626/94 o del D.Lgs 494/96 e quindi perseguibili penalmente con l'arresto o l'ammenda per il Datore di Lavoro, i Dirigenti o i Preposti. Scopo dei tecnici del CPT è quello di rilevare, in sede di visita in cantiere, tali situazioni anomale, aiutare i presenti a comprenderne la natura, le cause e gli eventuali effetti potenzialmente dannosi che le anomalie avrebbero potuto provocare ai lavoratori, fornendo al contempo dei suggerimenti per la messa in atto di azioni rivolte al miglioramento della sicurezza.

Facciamo notare che anche quest'anno sono al primo posto le anomalie relative alla categoria **PONTEGGI**: pari a **936** infrazioni su un numero totale di **3013** infrazioni (su tutte le categorie e non solo sui ponteggi), che si suddividono poi in 311 casi documentali (su 896) e 625 casi sostanziali (su 2117).

Le infrazioni relative ai ponteggi hanno quindi un peso superiore al **30%** sul totale delle non conformità rilevate.

A seguire troviamo anomalie relative ai **PARAPETTI** ed alle **GRU**. (Vedere Tabelle in allegato)

## **DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN CANTIERE**

Approfittiamo dello spazio di questa circolare informativa per comunicare un altro tema importante relativo alla sicurezza dei lavoratori in cantiere recentemente trattato in un **Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato le Regioni e le Province autonome n. 2540 del 16 marzo 2006**, riguardante l'assunzione di alcolici in cantiere. La disposizione ha finalmente individuato (nell'Allegato I) le attività ad elevato rischio d'infortuni sul lavoro, nell'esecuzione delle quali è **vietata l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche**. Il provvedimento è stato emanato in applicazione all'art. 15, comma 1, della Legge quadro 30 marzo 2001 n. 125. Il punto 10 del citato Allegato I stabilisce che tale divieto sia applicato ad ogni genere di cantiere ed a tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.



COMITATO PARITETICO TERRITORIALE  
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO  
PER LA PROVINCIA DI PADOVA

# CPT: SERVIZI ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI



Riteniamo infine importante ricordare che il **servizio di informazione** offerto dal C.P.T. di Padova a tutte le imprese ed ai lavoratori, è attivo il **lunedì pomeriggio** (dalle ore **15.00** alle **18.30**) presso la sede della Cassa Edile di Padova. Il servizio è **GRATUITO** e riguarda :

- **Ricevimento su appuntamento** di addetti, lavoratori ed imprenditori che riterranno necessario ottenere informazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Informazione alle imprese ed ai lavoratori** relativamente a:
  - a) rischi per la sicurezza connessi all'attività svolta in generale;
  - b) misure di protezione e prevenzione necessarie e da adottare;
  - c) rischi specifici in relazione all'attività svolta
  - d) aggiornamenti sulle normative di sicurezza previste dalla legge.
- **Consulenza telefonica** sulla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Informazioni nella **scelta dei mezzi** (dispositivi ed attrezzature) di protezione individuale e collettiva più idonei alle necessità dell'impresa;
- **Informazioni tecniche** su lavorazioni edili o attività particolari in relazione alla Sicurezza.

Alcuni documenti importanti sono inoltre scaricabili in formato PDF anche dal portale: [www.cassaedile.pd.it](http://www.cassaedile.pd.it), nell'area dedicata alle circolari d'informazione del CPT di Padova.  
Per fax e telefono: 049 657253

Il Vicepresidente  
Omero Cazzaro

Il Presidente  
Angelo Marcon



| <b>VISITE EFFETTUATE DAL 01.01.05 AL 31.12.05</b> |                         |            |  |  |
|---|-------------------------|------------|--|--|
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>IMPRESE VISITATE</b> | <b>208</b> |  |  |
|   | DI CUI                  |            |  |  |
|   | <b>TIPO IMPRESA</b>     |            |  |  |
|   | ARTIGIANE               | <b>36</b>  |  |  |
|   | COOPERATIVE             | <b>6</b>   |  |  |
|   | INDUSTRIALI             | <b>88</b>  |  |  |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>NUMERO TOTALE VISITE</b>       | <b>266</b> |
| COSTRUZIONE: ABITAZIONE           | <b>169</b> |
| COSTRUZIONE: ED. COMMERCIALE      | <b>13</b>  |
| COSTRUZIONE: ED. INDUSTRIALE      | <b>3</b>   |
| COSTRUZIONE: STRADALE             | <b>5</b>   |
| RISTRUTTURAZIONE: ABITAZIONE      | <b>8</b>   |
| RISTRUTTURAZIONE: ED. COMMERCIALE | <b>4</b>   |
| RISTRUTTURAZIONE: ED. INDUSTRIALE | <b>1</b>   |
| RISTRUTTURAZIONE: STRADALE        | <b>1</b>   |
| MANUTENZIONE: ABITAZIONE          | <b>1</b>   |
| MANUTENZIONE: ED. COMMERCIALE     |            |
| MANUTENZIONE: ED. INDUSTRIALE     |            |
| MANUTENZIONE: STRADALE            |            |
| COSTRUZIONE: ED. PUBBLICA         | <b>12</b>  |
| RISTRUTTURAZIONE: ED. PUBBLICA    | <b>19</b>  |
| MANUTENZIONE: ED. PUBBLICA        | <b>2</b>   |
| IMPIANTO FISSO: PREFABBRICATI     |            |
| COSTRUZIONE: COMMERC. E RESID.    | <b>27</b>  |
| IMPIANTO FISSO                    |            |
| DA DEFINIRE                       | <b>1</b>   |




**NUMERO TOTALE DI SITUAZIONI NON CONFORMI: 3013  
(RELATIVE A 266 VISITE effettuate dal 01.01.05 al 31.12.05)**

| <b>AMBITO DELLA NON CONFORMITA'</b> | <b>D (documentale)</b> | <b>S (sostanziale)</b> |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Antincendio</b>                  | <b>0</b>               | <b>149</b>             |
| Aperture                            | 0                      | 1                      |
| Betoniera                           | 0                      | 83                     |
| Cantiere                            | 1                      | 93                     |
| Demolizioni                         | 1                      | 3                      |
| <b>Documentazione</b>               | <b>241</b>             | <b>0</b>               |
| <b>Gru</b>                          | <b>120</b>             | <b>327</b>             |
| Impianto di terra                   | 1                      | 10                     |
| Impianto elettrico                  | 96                     | 94                     |
| Luoghi di transito                  | 0                      | 4                      |
| Macchine                            | 0                      | 21                     |
| Mezzi sollevamento                  | 0                      | 2                      |
| <b>Parapetti</b>                    | <b>0</b>               | <b>355</b>             |
| Passerella                          | 0                      | 7                      |
| <b>Piano sicurezza</b>              | <b>118</b>             | <b>0</b>               |
| <b>Ponteggi</b>                     | <b>311</b>             | <b>625</b>             |
| Ponti mobili                        | 0                      | 3                      |
| Ponti su cavalletti                 | 0                      | 2                      |
| Prefabbricati                       | 0                      | 1                      |
| Prodotti chimici                    | 1                      | 0                      |
| Pronto soccorso                     | 0                      | 65                     |
| Protezioni individuali              | 0                      | 13                     |
| Rumore                              | 6                      | 0                      |
| Scale a mano                        | 0                      | 19                     |
| Scale fisse                         | 0                      | 1                      |
| Scavi                               | 0                      | 28                     |
| Sega circolare                      | 0                      | 81                     |
| Sega mattoni                        | 0                      | 14                     |
| Segnaletica sicurezza               | 0                      | 1                      |
| Servizi                             | 0                      | 77                     |
| Silo                                | 0                      | 27                     |
| Stoccaggio rifiuti                  | 0                      | 8                      |
| Tetto                               | 0                      | 1                      |
| Viabilità                           | 0                      | 2                      |
| <b>totale</b>                       | <b>896</b>             | <b>2117</b>            |



## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE NON CONFORMITA' in relazione alla frequenza rilevata per ogni ambito (266 VISITE effettuate dal 01.01.05 al 31.12.05)

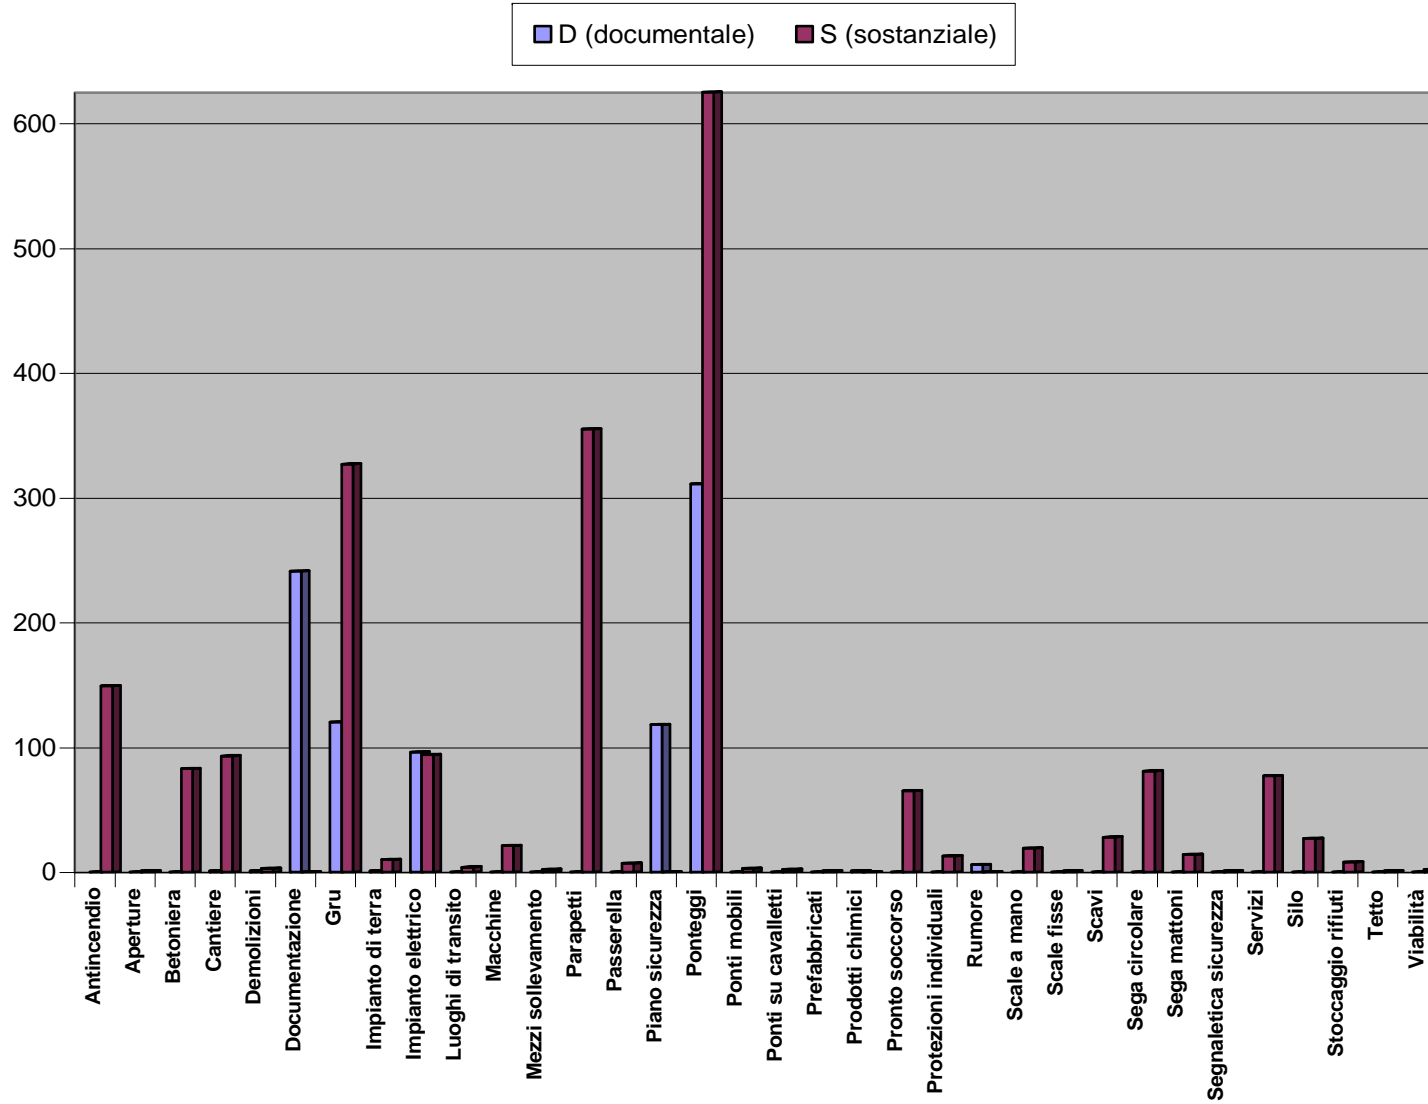



**LISTA DELLE NON CONFORMITA' RILEVATE DA C.P.T. SUDDIVISE PER TIPO  
DISTINZIONE FRA DOCUMENTALI E SOSTANZIALI  
VISITE EFFETTUATE DAL 1/01/05 AL 31/05/05 - TOTALE VISITE=266**

| AMBITO                    | TIPO  | N. CASI DOCUMENTALI |            | N. CASI SOSTANZIALI |            |
|---------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|------------|
|                           |   |                     | totale     |                     | totale     |
| <b>Antincendio</b>        | Estintori mancanti / insufficienti                | 0                   |            | 140                 |            |
|                           | Estintori non revisionati                         | 0                   | <b>0</b>   | 9                   | <b>149</b> |
| <b>Aperture</b>           | A terra: mancanza protezione                      | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | A parete: mancanza protezione                     | 0                   |            | 0                   |            |
|                           | A terra: protezione insufficiente                 | 0                   | <b>0</b>   | 0                   | <b>1</b>   |
| <b>Betoniera</b>          | protezione ingranaggi/pulegge                     | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | protezione corona dentata                         | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | protezione pedale                                 | 0                   |            | 3                   |            |
|                           | posizione pericolosa/instabile                    | 0                   |            | 7                   |            |
|                           | Messa a terra                                     | 0                   |            | 31                  |            |
|                           | Tettoia protezione operatore                      | 0                   | <b>0</b>   | 40                  | <b>83</b>  |
| <b>Prefabbricati</b>      | delimitazione area lavori                         | 0                   | <b>0</b>   | 1                   | <b>1</b>   |
| <b>Demolizioni</b>        | Protezioni anticaduta                             | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | protezioni per caduta materiali                   | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | progetto non in cantiere                          | 1                   |            | 0                   |            |
|                           | sbarramento area demolizioni                      | 0                   | <b>1</b>   | 1                   | <b>3</b>   |
| <b>Tetto</b>              | accesso non regolamentare                         | 0                   | <b>0</b>   | 1                   | <b>1</b>   |
| <b>Gru</b>                | Documentazione: libretto mancante                 | 9                   |            | 0                   |            |
|                           | Funi: verifica trimestrale                        | 0                   |            | 151                 |            |
|                           | Messa a terra                                     | 0                   |            | 17                  |            |
|                           | Interferenti: adottare ordine servizio            | 0                   |            | 6                   |            |
|                           | manutenzione ordinaria periodica                  | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | posto di manovra: protezione anticaduta           | 0                   |            | 13                  |            |
|                           | Distanza minima da linee elettriche: 5 metri      | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | ISPELS: copia denuncia nuova gru                  | 1                   |            | 0                   |            |
|                           | ISPELS: fare denuncia nuova gru                   | 109                 |            | 0                   |            |
|                           | interferenti: accordo interaziendale              | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | impianto elettrico non protetto                   | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | percorso: delimitare con nastro giallo            | 0                   |            | 2                   |            |
|                           | cartello indicazioni uso: mancante                | 1                   |            | 0                   |            |
|                           | Certificazione collaudo                           | 0                   |            | 0                   |            |
|                           | Carter protezione cinghie di trasmissione         | 0                   |            | 7                   |            |
|                           | Segregare zona rotazione bassa                    | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | Catene: verifica trimestrale                      | 0                   | <b>120</b> | 126                 | <b>327</b> |
| <b>Rumore</b>             | valutazione esposizione lavoratori: d.lgs. 277/91 | 6                   | <b>6</b>   | 0                   | <b>0</b>   |
| <b>Impianto elettrico</b> | illuminazione insufficiente                       | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | prese/spine non a norma CEI                       | 0                   |            | 1                   |            |
|                           | collegamento a terra                              | 0                   |            | 14                  |            |
|                           | L. 46/90: dichiarazione conformità                | 87                  |            | 0                   |            |
|                           | Quadri: collegamento a terra                      | 0                   |            | 7                   |            |
|                           | Quadri: certific. norma EN60349-4                 | 0                   |            | 1                   |            |



| AMBITO                                | TIPO  | N. CASI DOCUMENTALI |           | N. CASI SOSTANZIALI |            |
|---------------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|------------|
|                                       |   |                     | totale    |                     | totale     |
|                                       | quadro distribuzione mancante                   | 0                   |           | 2                   |            |
|                                       | Quadri: targa indelebile                        | 0                   |           | 8                   |            |
|                                       | Schema: non presente in cantiere                | 9                   |           | 0                   |            |
|                                       | Non utilizzare prese multiple                   | 0                   | <b>96</b> | 60                  | <b>94</b>  |
| <b>Impianto di terra</b>              | denuncia impianto                               | 1                   |           | 0                   |            |
|                                       | Conduttori sprovvisti di capicorda              | 0                   |           | 6                   |            |
|                                       | rendere ispezionabili i dispersori              | 0                   | <b>1</b>  | 4                   | <b>10</b>  |
| <b>Stoccaggio rifiuti e materiali</b> | smaltimento rifiuti pericolosi Non corretto     | 0                   |           | 7                   |            |
|                                       | Allestite/delimitate zone stoccaggio e deposito | 0                   | <b>0</b>  | 1                   | <b>8</b>   |
| <b>Macchine</b>                       | pompa: messa a terra                            | 0                   |           | 5                   |            |
|                                       | piegaferro: messa a terra                       | 0                   |           | 4                   |            |
|                                       | Tagliaferro: protezione lame                    | 0                   |           | 1                   |            |
|                                       | piegaferro: protezione lame                     | 0                   |           | 1                   |            |
|                                       | Tagliaferro: messa a terra                      | 0                   |           | 2                   |            |
|                                       | Operatrici: segnalatore acustico in retromarcia | 0                   | <b>0</b>  | 8                   | <b>21</b>  |
| <b>Mezzi sollev.</b>                  | Obbligo ceste/cassoni                           | 0                   |           | 1                   |            |
|                                       | Funi: verifica trimestrale                      |                     | <b>0</b>  | 1                   | <b>2</b>   |
| <b>Parapetti</b>                      | corrente intermedio                             | 0                   |           | 1                   |            |
|                                       | tavola fermapiede: altezza minima 20 cm         | 0                   |           | 7                   |            |
|                                       | Da revisionare                                  | 0                   |           | 2                   |            |
|                                       | manacanti                                       | 0                   |           | 6                   |            |
|                                       | carico/scarico parapetti mobili                 | 0                   |           | 5                   |            |
|                                       | solaio: mancanti su perimetro                   | 0                   |           | 46                  |            |
|                                       | poggioli/terrazze mancanti                      | 0                   |           | 53                  |            |
|                                       | tetto: mancanti                                 | 0                   |           | 1                   |            |
|                                       | Incompleti                                      | 0                   |           | 115                 |            |
|                                       | solaio: mancanti sui fori                       | 0                   |           | 23                  |            |
|                                       | apertura sul vuoto: mancanti                    | 0                   |           | 52                  |            |
|                                       | ascensore: apertura non protetta                | 0                   |           | 21                  |            |
|                                       | scale fisse: protezione laterale                | 0                   |           | 4                   |            |
|                                       | scale fisse: accesso non protetto               | 0                   |           | 1                   |            |
|                                       | scavi perimetrali: mancanti                     | 0                   |           | 16                  |            |
|                                       | montaggio/smontaggio: cintura di sicurezza      | 0                   | <b>0</b>  | 2                   | <b>355</b> |
| <b>Passerella</b>                     | mancante/incompleta                             | 0                   |           | 3                   |            |
|                                       | parapetto: mancante                             | 0                   |           | 3                   |            |
|                                       | da irrobustire                                  | 0                   | <b>0</b>  | 1                   | <b>7</b>   |
| <b>Ponteggi</b>                       | Basette ripartizione carico                     | 0                   |           | 33                  |            |
|                                       | Parapetto: incompleto                           | 0                   |           | 120                 |            |
|                                       | Ancoraggi non secondo progetto                  | 0                   |           | 4                   |            |
|                                       | Sottoponte sicurezza: incompleto                | 0                   |           | 11                  |            |
|                                       | Mancanti parzialmente                           | 0                   |           | 10                  |            |
|                                       | altezza insufficiente                           | 0                   |           | 7                   |            |
|                                       | Parapetto: tavola fermapiede                    | 0                   |           | 3                   |            |
|                                       | piano appoggio: livellamento                    | 0                   |           | 30                  |            |
|                                       | Da revisionare                                  | 0                   |           | 36                  |            |
|                                       | Mancanti totalmente                             | 0                   |           | 1                   |            |
|                                       | elementi non omologati                          | 0                   |           | 30                  |            |
|                                       | Documentazione: libretto / omologazione         | 108                 |           | 0                   |            |
|                                       | Piani calpestio: incompleti                     | 0                   |           | 64                  |            |



| AMBITO                        | TIPO   | N. CASI DOCUMENTALI |        | N. CASI SOSTANZIALI |        |
|-------------------------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                               |  |                     | totale |                     | totale |
|                               | parapetto: corrente superiore                    | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | parapetto: incompleto su testate                 | 0                   |        | 6                   |        |
|                               | Incompleti                                       | 0                   |        | 34                  |        |
|                               | Ancoraggi insufficienti /irregolari              | 0                   |        | 108                 |        |
|                               | Documentazione:autorizz.ministeriale uso         |                     |        |                     |        |
|                               | ponteggi   | 8                   |        | 0                   |        |
|                               | Distanza da corpo fabbrica > 20 cm.              | 0                   |        | 50                  |        |
|                               | Piani calpestio: sgombero materiali              | 0                   |        | 20                  |        |
|                               | montaggio: uso elmetto                           | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | Parapetto: mancante                              | 0                   |        | 4                   |        |
|                               | parapetto:da rafforzare                          | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | Sottoponte sicurezza: mancante                   | 0                   |        | 22                  |        |
|                               | piano appoggio: irregolari su poggioni           | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | materiale pesante: non depositare                | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | ancoraggi mancanti                               | 0                   |        | 3                   |        |
|                               | mantovane su zone passaggio                      | 0                   |        | 22                  |        |
|                               | montanti: calcolo elementi di sostegno           | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | piani calpestio: chiudere botola                 | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | Documentazione: disegno esecutivo                |                     |        |                     |        |
|                               | capocantiere                                     | 195                 | 311    | 0                   | 625    |
| <b>Piano sicurezza</b>        | cantiere: descrizione                            | 1                   |        | 0                   |        |
|                               | attrezzature descrizione                         | 2                   |        | 0                   |        |
|                               | Subappalto: mancanza piano sicurezza             | 78                  |        | 0                   |        |
|                               | Non in cantiere                                  | 36                  |        | 0                   |        |
|                               | Subappalto: acquisizione piani                   | 1                   | 118    | 0                   | 0      |
| <b>Ponti su cavalletti</b>    | piano di calpestio: incompleto                   | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | devono poggiare su superfici solide/livellate    | 0                   | 0      | 1                   | 2      |
| <b>Ponti mobili</b>           | parapetti: mancanti                              | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | parapetti: incompleti                            | 0                   | 0      | 2                   | 3      |
| <b>Prodotti chimici</b>       | Schede di sicurezza non presenti                 | 1                   | 1      | 0                   | 0      |
| <b>Pronto soccorso</b>        | Non presente                                     | 0                   |        | 42                  |        |
|                               | Non completo                                     | 0                   | 0      | 23                  | 65     |
| <b>Luoghi di transito</b>     | Mantovana / tettoia                              | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | armatura: protezione ferri                       | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | passerella su armatura                           | 0                   | 0      | 2                   | 4      |
| <b>Protezioni individuali</b> | Protezioni anticaduta                            | 0                   |        | 2                   |        |
|                               | elemetto   | 0                   |        | 7                   |        |
|                               | non presenti in cantiere                         | 0                   |        | 3                   |        |
|                               | cuffie e tappi antirumore                        | 0                   | 0      | 1                   | 13     |
| <b>Cantiere</b>               | esposizione tabella di cantiere                  | 1                   |        | 0                   |        |
|                               | Recinzione mancante                              | 0                   |        | 5                   |        |
|                               | aperto   | 0                   |        | 2                   |        |
|                               | recinzione incompleta                            | 0                   |        | 50                  |        |
|                               | pareti rocciose: controllo stabilità             | 0                   |        | 1                   |        |
|                               | Sgombero macerie: predisporre "canale" a scivolo | 0                   |        | 5                   |        |
|                               | Stoccaggio e smaltimento macerie non corretti    | 0                   | 1      | 30                  | 93     |
| <b>Scale a mano</b>           | non solidamente ancorate                         | 0                   |        | 7                   |        |





| AMBITO                          | TIPO  | N. CASI DOCUMENTALI     | totale     | N. CASI SOSTANZIALI     | totale      |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|
|                                 | non regolamentari                                 | 0                       |            | 8                       |             |
|                                 | piedini antiscivolo                               | 0                       |            | 1                       |             |
|                                 | lungh. 1 m oltre punto di arrivo                  | 0                       | <b>0</b>   | 3                       | <b>19</b>   |
| <b>Scavi</b>                    | parapetto: mancante                               | 0                       |            | 4                       |             |
|                                 | armatura: sostegni                                | 0                       |            | 1                       |             |
|                                 | Materiale sul ciglio: allontanare                 | 0                       |            | 2                       |             |
|                                 | Inclinazione pareti                               | 0                       |            | 10                      |             |
|                                 | rampa accesso                                     | 0                       |            | 1                       |             |
|                                 | interventi per stabilizzazione pareti             | 0                       |            | 3                       |             |
|                                 | Recinzione mancante                               | 0                       |            | 3                       |             |
|                                 | Parapetto: incompleto/insufficiente               | 0                       | <b>0</b>   | 4                       | <b>28</b>   |
| <b>Scale fisse</b>              | tavola fermapiede: mancante                       | 0                       | <b>0</b>   | 1                       | <b>1</b>    |
| <b>Sega circolare</b>           | Coltello divisore                                 | 0                       |            | 0                       |             |
|                                 | carter cinghia pulegge                            | 0                       |            | 1                       |             |
|                                 | Messa a terra                                     | 0                       |            | 76                      |             |
|                                 | interruttore di riavvio volontario dopo black-out | 0                       |            | 1                       |             |
|                                 | cuffia registrabile                               | 0                       | <b>0</b>   | 3                       | <b>81</b>   |
| <b>Sega mattoni</b>             | Messa a terra                                     | 0                       | <b>0</b>   | 14                      | <b>14</b>   |
| <b>Segnaletica di sicurezza</b> | elemento  | 0                       | <b>0</b>   | 1                       | <b>1</b>    |
| <b>Servizi</b>                  | locale WC mancante                                | 0                       |            | 14                      |             |
|                                 | condizioni igieniche                              | 0                       |            | 2                       |             |
|                                 | spogliatoio mancante/insufficiente                | 0                       |            | 5                       |             |
|                                 | igienici mancanti                                 | 0                       |            | 10                      |             |
|                                 | igienici insufficienti                            | 0                       |            | 3                       |             |
|                                 | refettorio mancante                               | 0                       |            | 2                       |             |
|                                 | Igienici: sprovvisti di acqua                     | 0                       | <b>0</b>   | 41                      | <b>77</b>   |
| <b>Silo</b>                     | Messa a terra                                     | 0                       | <b>0</b>   | 27                      | <b>27</b>   |
| <b>Viabilità</b>                | pulizia vie di transito                           | 0                       | <b>0</b>   | 2                       | <b>2</b>    |
| <b>Documentazione</b>           | Non presente in cantiere                          | 181                     |            | 0                       |             |
|                                 | denuncia INAIL mancante                           | 1                       |            | 0                       |             |
|                                 | Notifica preliminare affissa in modo visibile     | 57                      |            | 0                       |             |
|                                 | Corsi formazione lavoratori                       | 2                       | <b>241</b> | 0                       | <b>0</b>    |
| <b>TOTALE NON CONFORMITA'</b>   | <b>3013</b>                                       | <b>tot. Documentali</b> | <b>896</b> | <b>tot. Sostanziali</b> | <b>2117</b> |
